


106-107年度  
中部科學工業園區  
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)  
環境監測計畫

106年12月環境監測結果說明

107年05月23日

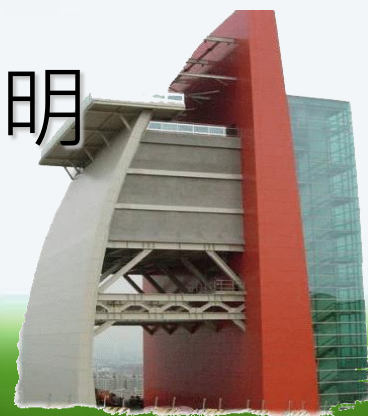

# 簡報大綱

GTSP

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



# 壹、本月執行項目說明

## ■ 施工期間監測

監測類別	監測內容	監測地點	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	1.東大路 2.科園二路	每月2次	12/5、12/19

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

# 壹、本月執行項目說明

GTSP

## ■ 營運期間監測

監測類別	監測內容	監測地點	監測頻率	監測執行日期
納管水質	重金屬銅	擴建用地新設之半導體晶圓廠納管水質檢測口	每月1次	12/4



# 貳、本月執行成果說明



## ■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L <sub>eq</sub> )		最大音量(L <sub>max</sub> )	
			測值	標準值	測值	標準值
東大路	106.12.05	擴建用地工程	66.5	80	72.9	100
	106.12.19	擴建用地工程	68.8		80.7	
科園二路	106.12.05	擴建用地工程	66.7		72.5	
	106.12.19	擴建用地工程	71.0		76.9	



## 貳、本月執行成果說明

### 營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.082 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

