


108-109年度
中部科學園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫

109年02月環境監測結果說明

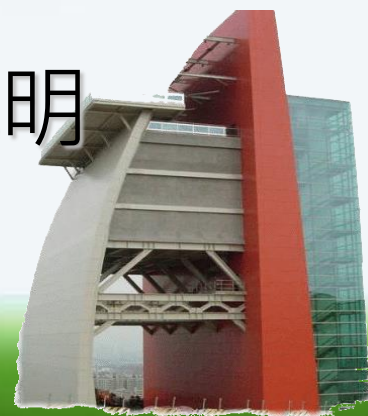

簡報大綱

GTSP

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	均能音量 L_{eq} 、最大噪音 L_{max}	每月2次	2/4、2/20

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

壹、本月執行項目說明

營運期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
納管水質	擴建用地新設之半導體晶圓廠 納管水質檢測口	重金屬銅	每月1次	2/4

貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L_{eq})		最大音量(L_{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
台積電北側	109.02.04	擴建用地工程	62.5	80	78.3	100
	109.02.20		54.1		59.0	
台積電南側	109.02.04		60.4		65.5	
	109.02.20		58.7		62.1	

貳、本月執行成果說明

營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.045 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)

