


110-112年度
中部科學園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫
110年12月環境監測結果說明

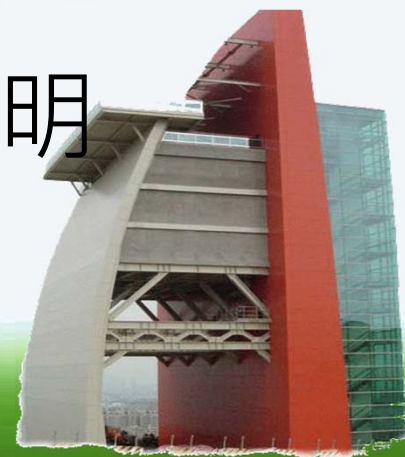

簡報大綱

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	均能音量 L_{eq} 、最大噪音 L_{max}	每月2次	12/7、12/20

本月無工區水放流，故無進行工區放流水之監測

壹、本月執行項目說明

GTSP

■ 營運期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
納管水質	擴建用地新設之半導體晶圓廠納管水質檢測口	重金屬銅	每月1次	12/6



貳、本月執行成果說明



■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L_{eq})		最大音量(L_{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
台積電工區北側	110.12.07	擴建用地廠商 附屬建物工程	61.1	80	67.8	100
	110.12.20		60.8		69.1	
台積電工區南側	110.12.07		61.5		76.5	
	110.12.20		62.9		70.1	



貳、本月執行成果說明

營運期監測說明-納管水質

- ▶ 本月納管水質銅監測結果為 0.023 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

