


108-109年度
中部科學工業園區
臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)
環境監測計畫

108年12月環境監測結果說明

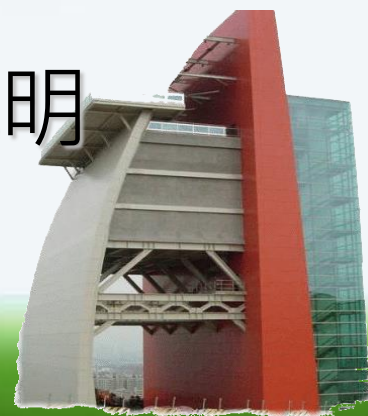

簡報大綱

GTSP

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
營建噪音	工區周界設2點	均能音量 L_{eq} 、最大噪音 L_{max}	每月2次	12/2、12/16

本月無工區水放流，故無進行放流水水質之監測

壹、本月執行項目說明

GSP

■ 營運期間監測

監測類別	監測地點	監測內容	監測頻率	監測執行日期
納管水質	擴建用地新設之半導體晶圓廠納管水質檢測口	重金屬銅	每月1次	12/4



貳、本月執行成果說明

GSP

■ 施工期間監測說明-營建噪音

單位：dB(A)

地點	日期	工程類別	均能音量(L _{eq})		最大音量(L _{max})	
			測值	標準值	測值	標準值
東大路	108.12.02	擴建用地工程	69.0	80	76.1	100
	108.12.16		64.7		75.6	
東大路西側 (新科路)	108.12.02		61.6		76.2	
	108.12.16		62.7		78.9	

貳、本月執行成果說明

營運期監測說明-納管水質

- 本月納管水質銅監測結果為 0.059 mg/L，符合納管管制標準(0.8 mg/L)。

